VOLUME PRODUZIDO
4.306


CONSUMO MATERIAIS
1.601

TOTAL EM COMPRAS
R$ 0,00

FATURAMENTO DIRETO
R$ 233.659,34

Avanço do Planejamento (Planejado vs. Executado)

Frente	Atividade	Un.	Planejado	Executado	Desvio	% Atingido
Geral	IMPLANTAR PLACA AÉREA	UN	145	98	-47	67.6%
123	IMPLANTAÇÃO DE TACHA	UN	450	276	-174	61.3%

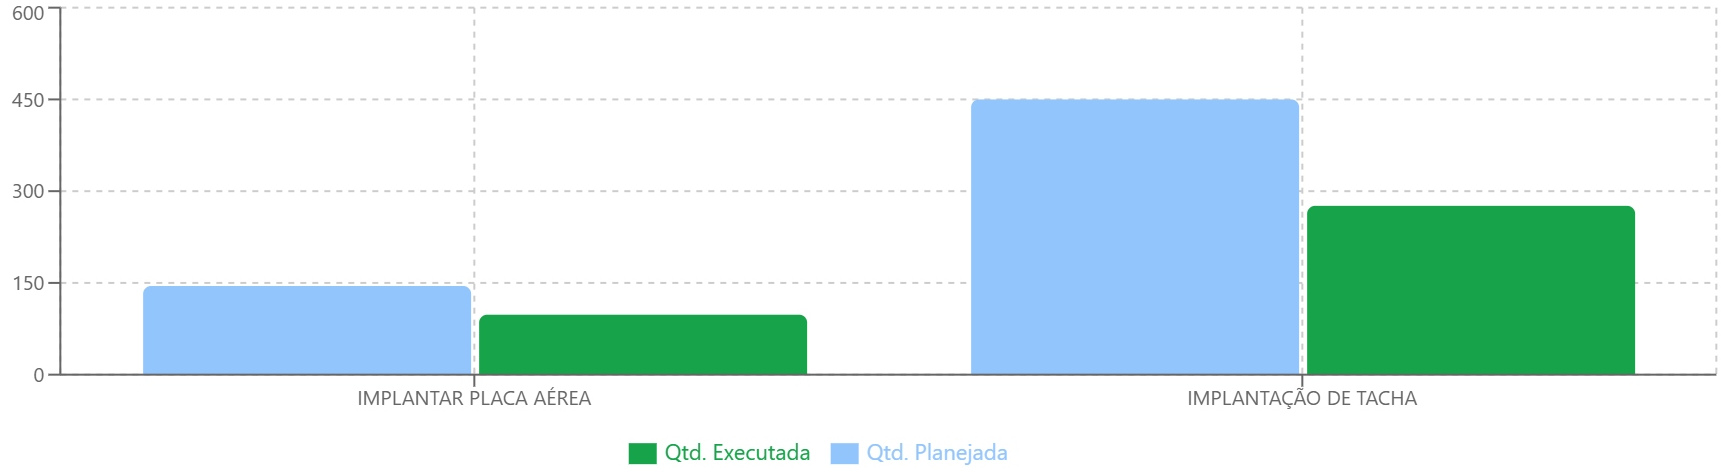

Faturamento Direto e Compras da Obra

Compras: R$ 0,00
Fat. Direto: R$ 233.659,34

Por Material | Por Fornecedor | Faturamento Direto

Produto	Tipo	Qtd. Comprada	Capacidade Uso	Preço Médio	Total Gasto
